Stadt Liestal

Tiefbau

Logisitik
Nonnenbodenweg
CH - 4410 Liestal
Tel. 061 927 52 82
logistik@liestal.ch

Gesuch für Grabarbeiten auf öffentlichen Strassen, Wegen und Plätzen (Allmend)

Dem Gesuch für Grabarbeiten ist ein Situationsplan mit der eingezeichneten Fläche beizulegen. Download eines Situationsplans wie folgt möglich: https://www.liestal.ch/_rte/thema2/38329

☐ ***Gesuchsteller/in:**			E-Mail
☐ *Bauherr:			
☐ *Bauleitung:	Kontaktperson	Mobilnummer	E-Mail
☐ *Unternehmer:	Kontaktperson	Mobilnummer	E-Mail

Beschreibung des Aufbruchs

Zweck:					
Strasse, Ort:			Parz.-Nr.:		
Dauer der Arbeiten:	Beginn:		Ende:		
Fläche:	Fahrbahn:	m²	Trottoir:		m²
Belagsart:	☐ Asphaltbelag	☐ Mergel	☐ Pflästerung	☐ Verbundsteine	☐
Absperrungen nötig?	☐ für Fahrverkehr		☐ für Fussgängerverkehr		

Vorinformation für den Gesuchsteller: Die vorstehend umschriebenen Grabarbeiten werden unter folgenden Bedingungen und Auflagen erteilt:

1. Die geltenden Bestimmungen zu Verkehrstechnik, Signalisation, Markierung, Unfallverhütung, Sicherheit (VSS, SIA, SN, SUVA, etc.) und die „**Bedingungen und Vorschriften bei Aufgrabung der Allmend**“ der Stadt Liestal sind jederzeit einzuhalten.


2. Für das Leitungswesen sind folgende Organe zuständig:

a) Vermessung (Geometer, LK)	Geometerbüro Jermann AG, 4410 Liestal
b) Elektrizitätswerk, TV	Elektra Baselland, 4410 Liestal
c) Telefon Kabel	Swisscom AG, 4002 Basel und Sunrise UPC
d) Wasserversorgung	Wasserversorgung, Nonnenbodenweg, 4410 Liestal
e) Gasleitungen	Industrielle Werke Basel (IWB)
f) Abwasser	Bereich Tiefbau, Abteilung Projektierung, Nonnenbodenweg 1, 4410 Liestal

3. Es sind folgende Beläge einzubauen (**wird in der Bewilligung bekannt gegeben**):

Busrouten, Bushaltestellen, besondere Routen:	min. 7cm ACT 22 H, 7cm ACB 22 H, 3cm AC 8 S
Strassen mit hohem Anteil an Schwerverkehr:	10 cm ACT 22 S Tragschicht und 3,5 cm Deckschicht AC 11 N
Sammel- und Quartierstrassen:	8 cm ACT 22 N Tragschicht und 3,5 cm Deckschicht AC 11 N
Trottoirs und Gehwege:	6 cm ACT 22 N Tragschicht und 3 cm Deckschicht AC 8 N oder 7 cm ACT 16 N Trag- und Deckschicht

4. **Ausschnitt aus der Norm SN 640 535 (minimaler Rückschnitt von 0.10-0.15 m kann bis auf 1.00 m «vergrössert» werden):**

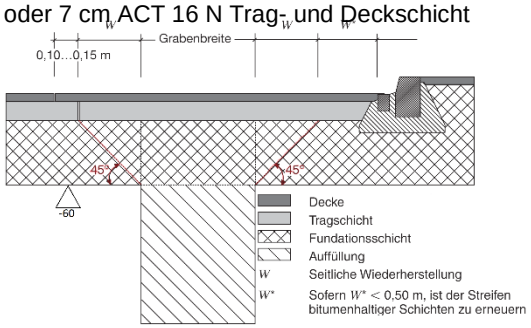

Bemerkungen:

Dieses Gesuch ist digital an **logistik**@liestal.ch und 1x in Papierform zu senden

Datum:

Unterschrift:
